



Vai finansējums no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” remontdarbu veikšanai slimnīcās pieprasīts iepriekš neprognozējamām un gadskārtējā budžetā neplānotām vajadzībām?

Starpziņojums

Rīga 2020



Latvijas Republikas
Valsts kontrole

Starpziņojums

Datums skatāms dokumenta paraksta laika zīmogā un dokumenta numurs teksta failā.

Vai finansējums no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" remontdarbu veikšanai slimnīcās pieprasīts iepriekš neprognozējamām un gadskārtējā budžetā neplānotām vajadzībām?

Pārbaudes veiktas un starpziņojums sagatavots, pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 3.punkta c) apakšpunktu un finanšu revīzijas "Par Veselības ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību" ietvaros (Valsts kontroles Trešā departamenta 27.04.2020. revīzijas grafiks Nr.2.4.1-9/2020).

Vāka noformējumā izmantots attēls no tīmekļa vietnes <http://depositphotos.com>, *Challenge success concept*, Author *georgejmlittle*, ID 58065143.

Saturs

Kāpēc sagatavots šis starpziņojums?.....	5
Kopsavilkums	6
Valsts kontroles ieteikums.....	7
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" loma ārkārtējās situācijas laikā	8
05.05.2020. piešķirtais finansējums no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 659 342 <i>euro</i> sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai.....	10
Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ūdensapgādes sistēmas avārijas situācija	10
Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" avārijas stāvoklī esošo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanai nepieciešamā finansējuma plānošana 2019.gadā	11
Noslēgtie līgumi stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" avārijas stāvoklī esošo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanai.....	12
LOC inženierkomunikāciju rekonstrukcijas pirmā posma darbi 2019.gadā.....	12
LOC inženierkomunikāciju rekonstrukcijas otrā posma darbi 2020.gadā.....	13
05.05.2020. piešķirtais finansējums no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 664 221 <i>euro</i> valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas nomaīņai.....	15
15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas avārijas situācija.....	15
Remontdarbu veikšanai nepieciešamais finansējums.....	19
Ieteikums	22
Revīzijas raksturojums	23

VAI FINANSĒJUMS NO BUDŽETA PROGRAMMAS "LĪDZEKĻI NEPAREDZĒTIEM GADĪJUMIEM" REMONTDARBU VEIKŠANAI SLIMNĪCĀS PIEPRASĪTS IEPRIEKŠ NEPROGNOZĒJAMĀM UN GADSKĀRTĒJĀ BUDŽETĀ NEPLĀNOTĀM VAJADZĪBĀM?

Atsauces..... 25

Kāpēc sagatavots šis starpziņojums?

Kopš ir stājies spēkā 701.starptautiskais revīzijas standarts "Ziņošana par galvenajiem revīzijas jautājumiem neatkarīga revidenta ziņojumā"¹, Valsts kontrolei ir pienākums izvērtēt nepieciešamību iekļaut galvenos revīzijas jautājumus revīzijas atzinumā par finanšu pārskatiem.

Minēto standartu izpratnē galvenie revīzijas jautājumi ir jautājumi, kas saskaņā ar revidenta profesionālo spriedumu ir kārtējā perioda finanšu pārskatu revīzijas kontekstā nozīmīgi jautājumi, par kuriem ziņo revidējamās vienības vadībai un kuriem revidents ir pastiprināti pievērsis uzmanību. Par galvenajiem revīzijas jautājumiem netiek sniegts atsevišķs atzinums.

Sniegtā informācija par galvenajiem revīzijas jautājumiem kalpo kā papildinformācija potenciālajiem finanšu pārskatu lietotājiem un palīdz gūt izpratni gan par jautājumiem, kurus revidents saskaņā ar profesionālo spriedumu ir atzinis par nozīmīgākajiem jautājumiem, gan par revidējamo vienību un jomām, kurās revidējamās vienības vadība ir izdarījusi nozīmīgus spriedumus revidēto finanšu pārskatu sagatavošanas procesā. Tāpat šī informācija var kalpot potenciālajiem lietotājiem kā pamatojums turpmākai saziņai ar revidējamās vienības vadību par konkrētiem pārvaldības aspektiem, revidētajiem finanšu pārskatiem vai veikto revīziju.

Galvenais revīzijas jautājums, kas ir visnozīmīgākais visās finanšu revīzijās par ministriju un centrālo valsts iestāžu 2020.gada pārskatu sagatavošanas pareizību, ir **papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotība un faktiskais izlietojums.**

2020.gadā Latviju, tāpat kā visu pasauli, ir skārusi Covid-19 pandēmija. 12.03.2020. Ministru kabinets pieņēma lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, un ārkārtējā situācija turpinājās līdz 09.06.2020.², bet no 09.11.2020. ārkārtējā situācija tika izsludināta atkārtoti³. Covid-19 izraisītie ārkārtas apstākļi ietekmē valsts, sabiedrības un katra cilvēka ikdienas dzīvi gan ārkārtējās situācijas laikā, gan pēc tās. Ārkārtējās situācijas apstākļi prasa spēju ātri reaģēt un pielāgoties, kā arī rada atkāpes no ierastās kārtības. Tie prasa institūciju spēju pastiprināti koordinēt savas darbības un savstarpēji sadarboties, izvairoties no juridiskā formālisma un resorisma, lai nodrošinātu valsts darbību un katra cilvēka aizsardzību ārkārtējos apstākļos.⁴

Covid-19 pandēmijas pārvarēšana un seku novēršana ir prasījusi ievērojamus valsts budžeta līdzekļus. Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas Ministru kabinets saistībā ar Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanu un seku novēršanu līdz 06.11.2020. kopumā ir pieņēmis lēmumus par valsts budžeta līdzekļu piešķirumu un pārdali pamatfunkciju īstenošanai par 1 096 294 453 *euro* un izskatījis priekšlikumus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas līdzekļu pārdali par 496 000 000 *euro*.⁵ Valsts kontrole velta īpašu uzmanību, lai izvērtētu Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai, tās seku novēršanai un mazināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

Veselības ministrijai līdz 06.11.2020. saistībā ar Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanu, seku mazināšanu un novēršanu Ministru kabinets ir piešķīris papildu līdzekļus 87 194 539 *euro* apmērā.

Lai finanšu revīzijā "Par Veselības ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību" sniegtu informāciju par izvirzīto galveno revīzijas jautājumu – papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotība –, Valsts kontrole veica pārbaudi un sagatavoja šo starpziņojumu par Veselības ministrijai piešķirto finansējumu 1 323 563 *euro* apmērā.

Kopsavilkums

Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 05.05.2020. piešķīra finansējumu 1 323 563 *euro* apmērā, lai sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – RAKUS) un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – PSKUS) nodrošinātu funkciju īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, veicot šī mērķa sasniegšanai nepieciešamos remontdarbus.

Ārstniecības iestādes piešķirtos līdzekļus izmantoja šādu remontdarbu veikšanai:

- ❖ RAKUS stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" (turpmāk – LOC) ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai – finansējumu, kas nepārsniedz 659 342 *euro*;
- ❖ PSKUS 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas nomaiņai – finansējumu, kas nepārsniedz 664 221 *euro*.

Valsts kontrole pārbaudes ietvaros vērtēja, vai līdzekļu pieprasījums no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ir sagatavots par iepriekš neprognozējamām un gadskārtējā iestādes budžetā neplānotām vajadzībām, kas ir tieši saistītas ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanu un pārvarēšanu. Valsts kontrole vērs uzmanību, ka, tā kā pārbaudes laikā remontdarbi nebija pabeigti, pārbaudē netika vērtēts paredzētā finansējuma izlietojums, ko, savukārt, veiks Nacionālais veselības dienests pēc remontdarbu pabeigšanas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un atbilstoši dokumentiem par finansējuma izlietojumu piešķiruma mērķim.

Valsts kontrole, pamatojoties uz revīzijā konstatētajiem faktiem, kritiski vērtē Veselības ministrijas sniegto pamatojumu finansējuma piešķiršanas steidzamībai un sasaistei ar Covid-19 izplatības ierobežošanu.

RAKUS stacionāra LOC ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu darbībā konstatēto problēmu risināšana ir slimnīcas dienaskārtībā jau kopš 2011.gada, un 2019.gadā šo darbu veikšanai tika noslēgti būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumi. Turklāt slimnīcas 2019.gada pārskatā norādīts, ka 2020.gadā plānots turpināt ūdensapgādes sistēmas atjaunošanas darbus (2.kārtu). Revidentu ieskatā, minētais liecina, ka būvdarbi tika mērķtiecīgi plānoti kā kārtējie remontdarbi ar tam iezīmētu finansējumu RAKUS budžetā vai zināmu/paredzamu finansēšanas avotu un noteiktu darbu pabeigšanas termiņu.

PSKUS 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas atkāpes no prasībām, kas ietekmē ēkas drošumu, tika konstatētas jau 2015.gadā, kad uz to esamību norādīja Būvniecības valsts kontroles birojs, tādēļ slimnīca organizēja pasākumus nepieciešamo remontdarbu īstenošanai (ēkas tehnisko apsekošanu, tehniskā projekta izstrādi, projekta un tā ietvaros sagatavotās tāmes sertifikāciju, būvdarbu iepirkumu plānošanu). Tomēr remontdarbi, lai nepieļautu turpmāko jumta stāvokļa pasliktināšanos un novērstu balkonu bojājumus, un nodrošinātu drošu ēkas turpmāko ekspluatāciju, tika atlikti un to izpildes termiņi – pagarināti. Slimnīca arī vairākkārt Būvniecības valsts kontroles birojam norādīja uz saviem plāniem šos remontdarbus veikt kārtējā gada budžeta ietvaros. Piemēram, atbilstoši slimnīcas budžeta iespējām 2020.gadā bija paredzēts veikt balkonu un dzegas atjaunošanu, bet 2021.gadā turpināt darbu pie ēkas jumta seguma nomaiņas.

Revidentu vērtējumā, nav pamata apšaubīt remontdarbu nepieciešamību RAKUS stacionāra LOC ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai un PSKUS 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas nomaiņai. Tomēr, revidentu ieskatā, abām slimnīcām savlaicīgi bija jāplāno remontdarbu veikšana un tam nepieciešamais finansējums, lai nepieļautu ēku ekspluatācijas drošības riskus un neradītu kaitējumu ēkas lietotājiem un garāmgājējiem. Turklāt slimnīcām funkciju īstenošana un sniegto veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktība jāgarantē visu laiku, ne tikai Covid-19 uzliesmojuma laikā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, revidenti secina, ka problēmas ar ēku tehnisko stāvokli RAKUS, PSKUS un Veselības ministrijai bija zināmas vēl ilgi pirms ārkārtējās situācijas iestāšanās, līdz ar to no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" finansējums pieprasīts un izlietots iepriekš prognozētām vajadzībām, kuru nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi bija jāplāno slimnīcu gadskārtējā budžetā. Valsts kontroles ieskatā, šāda Veselības ministrijas rīcība uzskatāma par neētisku, jo, norādot uz nepieciešamību Covid-19 pandēmijas apstākļos novērst risku veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktībai, tā pieļāva līdzekļu novirzīšanu slimnīcu ilgstoši nerisinātu un atliktu problēmu novēršanai vai jau iepriekš plānotu darbu veikšanai.

Valsts kontroles ieteikums

Revīzijā ir sniegts viens ieteikums, kuru ieviešot tiks sekmēta valsts budžeta līdzekļu efektīva un ekonomiska izlietošana atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Valsts kontrole aicina Veselības ministriju, pirms virzīt finansējuma pieprasījumu izskatīšanai Ministru kabinetā līdzekļu piešķiršanai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", izvērtēt pieprasījuma konkrēta pasākuma finansēšanai pamatotību un vispusīgi apzināt informāciju par kopējiem nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un to avotu šī pasākuma pilnvērtīgai pabeigšanai.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" loma ārkārtējās situācijas laikā


RAKUS loma

Valsts operatīvās medicīniskās komisijas 31.01.2020. sēdē⁶, kurā tika uzklausi atbildīgo dienestu ziņojumi par gatavību Covid-19 atklāšanai un ārstēšanai Latvijā, RAKUS informēja par gatavību uzņemt pacientus ar aizdomām par Covid-19, kā arī par RAKUS Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas gatavību veikt nepieciešamos laboratoriskos izmeklējumus.

Valsts operatīvās medicīniskās komisijas 31.01.2020. sēdē⁷ tika nolemts, ka Covid-19 konstatēšanas gadījumā ar to saslimušie pieaugušie tiks nogādāti RAKUS, un **slimnīcas stacionārs "Latvijas Infektoloģijas centrs" kļuva par galveno Covid-19 pacientu ārstēšanas centru valstī⁸.**

Atbilstoši pārbaudes laikā saņemtajai informācijai⁹ RAKUS ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 izplatības novēršanai iesaistīja visus stacionārus un Patoloģijas centru (skatīt 1.attēlu):

- ❖ stacionārā "Latvijas Infektoloģijas centrs" tika nodrošināta Covid-19 pacientu diagnostika un ārstēšana, kā arī analīžu paraugu testēšana;
- ❖ stacionārā "Biķernieki" tika izveidota HIV/AIDS nodaļa un Gaisa pilienu infekciju nodaļa, kuras tika pārvietotas no stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs", kā arī nodrošināta pacientu testēšana;
- ❖ LOC, nepārtraucot plānveida palīdzības sniegšanu gan stacionāriem, gan ambulatoriem onkoloģiskiem pacientiem, tika veikti nozīmīgi epidemioloģiskās drošības pasākumi, tai skaitā pacientu un personāla testēšana;
- ❖ stacionārā "Gaiļezers" tika izveidota Bīstamo infekciju nodaļa Covid-19 pacientiem, karantīnas nodaļa pašizolācijas pacientiem, kā arī tika nodrošināta ārstēšana Covid-19 pozitīviem pacientiem ar citām slimībām. Stacionārā tika nodalītas pacientu plūsmas, veikti infrastruktūras pielāgošanas darbi atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, nodrošināta sevišķi smagu Covid-19 pacientu ārstēšana Toksikoloģijas un sepses klīnikā;
- ❖ stacionārā "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" tika izveidotas izolācijas nodaļas Covid-19 pacientiem un pacientiem ar pneimoniju un aizdomām par Covid-19;
- ❖ Patoloģijas centrā tika veiktas autopsijas un mirušo uzglabāšana.



1.attēls. RAKUS iesaiste Covid-19 pacientu aprūpē.

PSKUS loma

Atbilstoši Valsts operatīvās medicīniskās komisijas 23.03.2020. sēdē nolemtajam¹⁰ PSKUS tika pilnvarota koordinēt un vismaz reizi nedēļā organizēt attālinātus seminārus slimnīcu speciālistiem pieredzes apmaiņai par Covid-19 pacientu atpazīšanu, izolēšanu, aprūpes algoritmiem, problēmu risinājumiem un citiem praktiskiem jautājumiem. Slimnīcu vadītājiem noteikts pienākums nodrošināt uzņemšanas nodaļu, intensīvās terapijas nodaļu virsārstu un virsmāsu piedalīšanos PSKUS organizētajos semināros.

Saskaņā ar PSKUS sniegto informāciju¹¹ ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 izplatības novēršanā bija iesaistīti ap 370 tās darbinieku. Piemēram, aptuveni 165 PSKUS Neatliekamās medicīnas centra darbinieki veica analīžu paraugu noņemšanu pacientiem, ārstēja un aprūpēja pacientus, kuri tika atvesti vai paši ieradās uzņemšanā¹².

Lai nepieciešamības gadījumā, palielinoties Covid-19 pacientu plūsmai, varētu nodrošināt to ārstēšanu, PSKUS ārkārtējās situācijas laikā, līdzīgi kā citas ārstniecības iestādes¹³, ierobežoja ambulatoro un stacionāro pakalpojumu sniegšanu, pārorganizēja darbu nodaļās¹⁴, lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību, un strādāja gatavības režīmā¹⁵. Piemēram, laika posmā no 25.03.2020. līdz 29.05.2020. tika izveidota speciāla karantīnas nodaļa ar 21 gultas vietu Covid-19 pozitīvo pacientu ārstēšanai¹⁶.

Ministru kabinets 05.05.2020. no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķīra finansējumu¹⁷, kas nepārsniedz 1 323 563 euro, lai nodrošinātu funkciju īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību RAKUS un PSKUS. Rīkojuma anotācijā¹⁸ norādīts, ka RAKUS un PSKUS ir vadošās iestādes ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību.

Revidentu ieskatā, jebkuras ārstniecības iestādes ēkas pieejamība un ekspluatācijas drošums ir svarīgs nosacījums tajā sniegto veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai, ne tikai Covid-19 uzliesmojuma laikā.

05.05.2020. piešķirtais finansējums no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 659 342 euro sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai

Ministru kabinets 05.05.2020. piešķīra finansējumu¹⁹, kas nepārsniedz 659 342 euro, RAKUS stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai.

Rīkojuma anotācijā²⁰ norādīts, ka RAKUS stacionāra LOC ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas stāvoklis neļauj pilnvērtīgi nodrošināt funkciju īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un, neturpinot iekšējo inženiertīklu atjaunošanu, paaugstinās risks iekārtu bojājumiem, pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem Covid-19 uzliesmojuma laikā, kā arī var samazināties sniegto pakalpojumu kvalitāte.

Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ūdensapgādes sistēmas avārijas situācija

Jau 2011.gadā LOC ēkā tika konstatētas būtiskas problēmas ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu darbībā, tāpēc sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO VIA"²¹ (turpmāk – SIA "PRO VIA") tajā pašā gadā izstrādāja tehnisko projektu RAKUS stacionāra LOC ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijai²². 2013.gadā RAKUS noslēdza līgumu²³ ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "WESEMANN" par kopējo summu 378 080,86 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) un daļēji īstenoja SIA "PRO VIA" 2011.gadā izstrādāto tehnisko projektu LOC ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijai, veicot kritiskāko inženierkomunikāciju posmu nomaiņu.

2019.gadā līguma ietvaros SIA "PRO VIA" veica LOC inženierkomunikāciju tehnisko apsekošanu²⁴, konstatējot, ka LOC ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšanai/uzlabošanai steidzami nepieciešams veikt esošo cauruļvadu posmu pārbūvi un stiprinājumu papildināšanu, un aktualizēja būvprojekta dokumentāciju LOC ūdensvada rekonstrukcijai kompleksi visiem pagraba stāvā esošajiem iekšējiem maģistrālajiem inženiertīkliem visos ēkas korpusos²⁵. Projekta dokumentāciju (aplūcinājuma karti) Rīgas pilsētas būvvalde akceptēja 04.06.2019., izdarot atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ar īstenošanas termiņu 04.06.2021.²⁶

Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" avārijas stāvoklī esošo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanai nepieciešamā finansējuma plānošana 2019.gadā

Veselības ministrija, 2019.gadā virzot Ministru kabineta rīkojuma projektu²⁷ par finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" daļējai SIA "PRO VIA" izstrādātā RAKUS stacionāra LOC ūdensvada rekonstrukcijas projekta īstenošanai, neiekļāva vispusīgu informāciju par kopējiem tam nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī nenorādīja, no kādiem līdzekļiem RAKUS plāno projektu īstenot un kad plāno pabeigt.

Revidentu ieskatā, RAKUS plānoja īstenot visu projektu kompleksi, un to apliecina šādi fakti:

- būvprojekts tika izstrādāts LOC ūdensvada rekonstrukcijai visiem pagraba stāvā esošajiem iekšējiem maģistrālajiem inženiertīkliem, kas bija kritiskā stāvoklī visos ēkas korpusos;
- Rīgas pilsētas būvvalde akceptēja apliecinājuma karti ūdensvada rekonstrukcijai visos LOC ēkas korpusos;
- RAKUS izsludināja iepirkumu visiem būvprojektā noteiktajiem būvdarbiem.

Jau 16.04.2019. RAKUS vērsās²⁸ Veselības ministrijā ar lūgumu finansiāli atbalstīt LOC avārijas stāvoklī esošo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanas un pārbūves darbu veikšanu, kā arī siltumapgādes sistēmu un elektroapgādes sistēmu atjaunošanu un pārbūvi. RAKUS norādīja, ka prognozējamās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un siltummezgla atjaunošanas izmaksas ir 1 540 931,87 euro (ar pievienotās vērtības nodokli). Savukārt precīzas izmaksas tiks noteiktas pēc būvniecības darbu iepirkuma. Vienlaikus RAKUS lūdza²⁹ Veselības ministrijai atļauju rīkot neatliekami veicamo inženierkomunikāciju atjaunošanas un pārbūves būvdarbu iepirkumu.

14.06.2019., vēl pirms Veselības ministrijas saskaņojuma atļaut rīkot iepirkumu, Elektronisko iepirkumu sistēmā tika izsludināts³⁰ RAKUS stacionāra LOC ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūves iepirkums ar kopējo paredzamo līgumcenu 1 273 500 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Tostarp vairāk nekā divus mēnešus vēlāk, 09.07.2019., Veselības ministrija informēja³¹ RAKUS par Ministru kabineta 02.07.2019. lēmumu³² piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas nepārsniedz 600 097 euro, lai segtu izdevumus saistībā ar RAKUS stacionāra LOC ūdensapgādes sistēmas atjaunošanu četros³³ no 10 korpusiem, kā arī aicināja RAKUS uzsākt iepirkumu.

Starpziņojuma saskaņošanas laikā RAKUS informēja³⁴, ka iepirkums tika izsludināts 2019.gada jūnijā, lai finanšu līdzekļu piešķiršanas gadījumā iespējami ātri varētu uzsākt plānotos būvdarbus.

Revidenti vērs uzmanību, ka Veselības ministrija bija informēta³⁵ par kopējām prognozējamām LOC ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un siltummezgla atjaunošanas izmaksām 1 540 931,87 euro (ar pievienotās vērtības nodokli) apmērā. Lai gan Ministru kabineta instrukcija³⁶ nosaka, ka tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas mērķis ir apzināt sekas un ietekmi, ko radīs šis projekts,

tomēr ministrija, virzot rīkojuma projektu par finansējuma piešķiršanu izskatīšanai Ministru kabinetā, anotācijā nesniedza informāciju, no kādiem līdzekļiem un kad RAKUS plāno turpināt un pabeigt stacionāra LOC ūdensapgādes sistēmas atjaunošanu.

Noslēgtie līgumi stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" avārijas stāvoklī esošo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanai

Pārbaudē konstatētais liek secināt, ka būvniecības darbi ir plānoti kā kārtējie remontdarbi ar tam iezīmēto finansējumu vai zināmu/paredzamu finansēšanas avotu un noteiktu darbu pabeigšanas termiņu, jo RAKUS veica iepirkumu un noslēdza līgumus par LOC ēkas visu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvi atbilstoši būvprojektam, kā arī būvdarbu uzraudzību un autoruzraudzību.

Pārbaudes laikā RAKUS revidenti norādīja³⁷, ka 2019.gadā nebija iespēju rast finansējumu visu būvprojektā (aplīdzinājuma kartē) paredzēto darbu realizācijai, tāpēc, slēdzot būvniecības līgumu, visi paredzētie darbi tika sadalīti divos posmos. Revidenti vērš uzmanību, ka 2019.gadā veikto iepirkumu rezultātā³⁸ tika noslēgti līgumi par visiem LOC pagraba stāva inženierkomunikāciju tīklu rekonstrukcijas (atjaunošanas) darbiem atbilstoši SIA "PRO VIA" izstrādātajai projekta dokumentācijai par kopējo summu 1 045 475,84 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa):

- ❖ 28.08.2019. tika noslēgts līgums³⁹ ar pilnsabiedrību "AKN" par LOC ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvi par kopējo līguma summu 987 175,84 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa). Līgums paredzēja, ka darbi var tikt veikti pa posmiem atbilstoši pieejamajam finansējumam. Abu posmu darbu pabeigšanas termiņš noteikts līdz 27.08.2021.;
- ❖ 01.08.2019. tika noslēgts līgums par autoruzraudzības darbu veikšanu ar būvprojekta autoru SIA "PRO VIA" par kopējo līguma summu 19 800 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa);
- ❖ 16.08.2019. tika noslēgts līgums ar pilnsabiedrību "L4 & MŪSU UZRAUGS"⁴⁰ par pārbūves darbu būvuzraudzību par kopējo līguma summu 38 500,00 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa).

LOC inženierkomunikāciju rekonstrukcijas pirmā posma darbi 2019.gadā

Revidenti vērš uzmanību, ka RAKUS pirmā posma būvdarbu izpildes laikā un tiem noslēdzoties neveica tehniskā projekta aplīdzinājuma kartes izmaiņas paveikto darbu garantijas saņemšanai, kas liecina par to, ka vēl pirms finansējuma piešķiršanas no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" RAKUS plānoja īstenot projektā paredzētos darbus.

Laika periodā no 06.09.2019. līdz 15.12.2019.⁴¹ ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve/atjaunošana veikta četros korpusos par kopējo summu 605 683,83 euro (ar pievienotās vērtības nodokli), tai skaitā 600 097 euro no 2019.gadā piešķirtā valsts budžeta finansējuma⁴² un 5586,83 euro no RAKUS budžeta līdzekļiem.

Revīzijas laikā RAKUS revidentiem nesniedza detalizētu informāciju, no kādiem līdzekļiem bija plānots nodrošināt atlikušo finansējumu visu darbu pabeigšanai, vienlaikus informējot⁴³, ka visus paredzētos rekonstrukcijas (atjaunošanas) darbus tika plānots veikt pamazām, atbilstoši pieejamajam finansējumam.

Starpziņojuma saskaņošanas laikā RAKUS norādīja⁴⁴, ka, apzinoties RAKUS finanšu situāciju, tika pieļauts, ka visus paredzētos darbus nebūs iespējams veikt.

Atbilstoši RAKUS līgumam⁴⁵ ar pilnsabiedrību "AKN" darbu garantijas laiks noteikts 60 mēneši no attiecīgā darbu posma nodošanas ekspluatācijā dienas.

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem⁴⁶ iekšējos inženiertīklus pieņemt ekspluatācijā ir iespējams tikai pēc to pilnīgas pabeigšanas atbilstoši būvprojektam. RAKUS projekta apliecinājuma karte paredz⁴⁷ visu inženiertīklu kompleksa vienotu izbūvi. Līdz ar to, lai RAKUS saņemtu veikto darbu garantiju, slimnīcai bija jānodrošina inženiertīklu kompleksa izbūves darbu pabeigšana atbilstoši būvprojektam vai autoruzraudzības kārtībā jānodrošina apliecinājuma kartes izmaiņas⁴⁸, tomēr izmaiņas līdz šim brīdim nav veiktas.

LOC inženierkomunikāciju rekonstrukcijas otrā posma darbi 2020.gadā

Tā kā LOC konstatēto problēmu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbībā risināšana ir RAKUS dienaskārtībā kopš 2011.gada un 2019.gadā šo darbu veikšanai jau ir noslēgti attiecīgi būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumi, tad revidenti secina, ka LOC ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas plānotā atjaunošana nav neparedzēts gadījums, turklāt tas nav saistāms ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu, kas atbilstoši tiesību aktos⁴⁹ noteiktajam būtu finansējams no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Turklāt RAKUS savlaicīgi izvērtēja un apzināja riskus saistībā ar ūdensvadu atšķirīgu spiediena izturību, daļēji atjaunojot inženiersistēmas.

Revidentu ieskatā, ņemot vērā valsts atbalstu, nosakot kompensāciju mehānismu ārstniecības iestādēm ārkārtējās situācijas laikā⁵⁰, kā arī paredzot Covid-19 ierobežošanai noteikto pasākumu finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem⁵¹, RAKUS remontdarbiem iepriekš plānotie līdzekļi būtu novirzāmi tam paredzētajam mērķim, nepieciešamības gadījumā rēķinoties ar slimnīcas finanšu ietaupījumu sakarā ar Covid-19 situāciju.

08.04.2020. RAKUS vērsās⁵² Veselības ministrijā ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt LOC pirmsavārijas stāvoklī esošo inženiertīklu pārbūves darbus par atlikušo summu 659 341,94 euro apmērā atbilstoši jau 2019.gadā ar būvdarbu veicēju, būvuzraugu un autoruzraugu noslēgtajiem līgumiem. Tāmē⁵³ tika iekļauta LOC ēkas 10 korpusu un piecu siltumsūkņu ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas atjaunošanas izmaksas, tai skaitā izmaksas darba algai, būvizstrādājumiem un mehānismiem.

Pārbaudes laikā, salīdzinot 2019.gada un 2020.gada tāmes, konstatēts, ka 2020.gadā RAKUS paredzēja finansējumu 72 000 euro apmērā to četru korpusu (K, L, Z, I) ūdensapgādes un

saimnieciskās kanalizācijas atjaunošanai, kuriem bija jābūt atjaunotiem jau 2019.gadā⁵⁴. RAKUS apstiprina⁵⁵, ka 2020.gada finansējuma pieprasījumā netika ietverti šajos četros korpusos jau veiktie darbi.

Kā pamatojumu 10 korpusu ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas atjaunošanai RAKUS minēja⁵⁶, ka nepārbūvēto maģistrālo ūdensvadu avāriju skaits palielinājies tieši pēc 2019.gadā veiktās jaunās ūdensapgādes sistēmas izbūves Z korpusā. 2020.gada martā RAKUS LOC ēkā konstatēti maģistrālā aukstā ūdens apgādes caurules savienojuma vietas starp diviem korpusiem bojājumi, jo 2019.gadā jaunizbūvētie ūdensvadi⁵⁷ ir ar augstāku ūdens plūsmas spiediena izturību un, savienojoties ar vecajiem ūdensvadiem, savienojumi neiztur straujas ūdens spiediena izmaiņas. Tādējādi, RAKUS ieskatā, bojājumi ir uzskatāmi par ārkārtas situāciju, jo pastāv risks ūdens noplūdēm arī no citām jaunizbūvēto un veco cauruļu savienojumu vietām.

Pārbaudot RAKUS iesniegtos dokumentus⁵⁸, kas apstiprina ūdensapgādes maģistrālo cauruļvadu avārijas LOC laikā no 01.10.2018. līdz 16.06.2020., konstatēts, ka 2020.gada pirmajā pusgadā ūdens spiediena izmaiņas izraisīja piecas avārijas LOC aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmā.

Atbildot uz revidentu jautājumu, vai RAKUS 2019.gadā izvērtēja risku, ka, veicot tikai daļēju inženiersistēmu atjaunošanu, var rasties avārijas situācijas un ūdens noplūdes saistībā ar ūdensvadu atšķirīgu spiediena izturību, un kāds bija plānotais risinājums šādiem gadījumiem, RAKUS informēja⁵⁹, ka pēc pirmā posma darbu pabeigšanas RAKUS risināja jautājumu par finansējuma paredzēšanu no slimnīcas budžeta (RAKUS revidentiem pārbaudes laikā konkrēti nenorādīja, kādā veidā tika risināts šis jautājums), lai novērstu bojājumu turpmāko attīstību kritiskākajās vietās.

RAKUS informēja⁶⁰, ka līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu tika apturētas vairākas RAKUS investīciju ieceres un visi brīvie un daļēji arī plānotie budžeta līdzekļi rezervēti, lai nepieciešamības gadījumā varētu operatīvi finansēt neplānotus izdevumus, nodrošinot pandēmijas apkarošanu un seku novēršanu. Tādējādi RAKUS par prioritāti budžeta izmantošanā uzskata tieši iesaistīšanos ārkārtējās situācijas risināšanā. Tomēr revidenti, analizējot RAKUS iesniegtās⁶¹ 2020.gada pirmā un otrā ceturkšņa budžeta tāmes, identificēja neizpildi dažādās budžeta izdevumu pozīcijās, piemēram, pozīcijā "Pakalpojumi" pirmajā pusgadā izveidojies ietaupījums 1 000 139 *euro* apmērā, tai skaitā:

- ❖ budžeta izdevumu pozīcijā "Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)" (EKK 2240) pirmajā ceturksnī veidojas ietaupījums 410 716 *euro* apmērā, jo ir samazinājušies izdevumi jumtu tīrīšanai un jumtu profilaktiskajiem remontdarbiem, un otrajā ceturksnī – 173 362 *euro* apmērā;
- ❖ budžeta izdevumu pozīcijā "Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem" (EKK 2220) veidojas ietaupījums kopsummā 242 428 *euro* apmērā, jo saistībā ar 12.03.2020. valstī izsludināto ārkārtējo situāciju daudzas RAKUS ārstniecības nodaļas tika slēgtas vai to darbs tika ierobežots.

Pēc finansējuma piešķiršanas no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" RAKUS 20.05.2020. noslēdza vienošanos⁶² ar pilnsabiedrību "AKN" par LOC ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūves darbu otrā posma darbu uzsākšanu ar darbu izpildes termiņu 15.12.2020. Turklāt RAKUS norādīja⁶³, ka visus darbus plānots izpildīt noteiktajā termiņā un nodot LOC izbūvēto inženierkomunikāciju ekspluatācijā līdz 15.12.2020., tādējādi novēršot situāciju par remontdarbiem neizmantoto valsts budžeta līdzekļu atmaksu valsts budžetā.

Pārbaudes laikā Veselības ministrija skaidroja⁶⁴ uzraudzības pār līdzekļu no neparedzētiem gadījumiem izlietojumu atbilstoši mērķim, norādot, ka 31.08.2020. Nacionālais veselības dienests un RAKUS noslēdza līgumu⁶⁵ par stacionāra LOC ūdensapgādes sistēmas atjaunošanas izdevumu segšanu, nosakot pienākumu slimnīcai iesniegt Nacionālajam veselības dienestam maksājumu apliecināšu dokumentu (rēķinu-pavadzīmju, nodošanas un pieņemšanas aktu, darbu izpildes aktu, maksājuma uzdevumu) kopijas par līdzekļu izlietojumu, ko RAKUS apņemas⁶⁶ iesniegt līdz 20.01.2021.

05.05.2020. piešķirtais finansējums no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 664 221 euro valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas nomaiņai

Ministru kabinets 05.05.2020. piešķir finansējumu⁶⁷, kas nepārsniedz 664 221 euro, PSKUS 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas nomaiņai.

Rīkojuma anotācijā⁶⁸ norādīts, ka PSKUS 15.korpusa ēkas jumta un balkonu nesošās konstrukcijas stāvoklis ir neapmierinošs, tāpēc nepieciešams neatliekamā kārtā uzsākt remontdarbus, lai nodrošinātu funkciju īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību Covid-19 uzliesmojumu laikā.

15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas avārijas situācija

Revidenti secina, ka Veselības ministrijas rīcībā jau kopš 2015.gada bija informācija par PSKUS 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas avārijas stāvokli, jo:

- jau 2015.gadā atbilstoši Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumam konstatētas atkāpes no prasībām, kas ietekmē ēkas drošumu;
- 2017.gadā, veicot tehnisko apsekošanu, arī SIA "LBS-Konsultants" sniedza ieteikumu izvērtēt iespēju tuvāko gadu laikā veikt jumta seguma nomaiņu, kā arī veikt jumta remonta darbus un novērst jumta nehermētiskumu.

Tomēr ne Veselības ministrija, ne PSKUS nerīkojās kā rūpīgs un atbildīgs saimnieks, jo remontdarbi jumta un balkonu bojājumu novēršanai četru gadu laikā vairākkārt tika atlikti un to izpildes termiņi – pagarināti, tā apdraudot slimnīcas pacientus, apmeklētājus un personālu, kā arī radot risku gan veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktībai, gan korpusā izvietoto medicīnas tehnoloģiju un iekārtu drošībai un saglabāšanai.

Pārbaudes laikā noskaidrots, ka Būvniecības valsts kontroles birojs 2015.gadā veica Veselības ministrijas īpašumā esošā PSKUS 15.korpusa⁶⁹ būves ekspluatācijas atbilstības normatīvajiem

aktiem⁷⁰ pārbaudi un 15.09.2015. sniedza atzinumu, konstatējot⁷¹ atkāpes no prasībām, kas ietekmē ēkas drošumu, tai skaitā:

- ❖ balkoniem (starpstāvu pārsegumiem) ir bojāts stieģrojuma aizsargslānis, un iespējami tā nodrupumi;
- ❖ ēkas bēniņu stāvā nesošo konstrukciju bojājumi – dzelzsbetona elementu aizsargslāņa bojājumi ilgstoša mitruma ietekmē, stipra lietus laikā nokrišņu ūdens iekļūst telpās;
- ❖ jumta koka konstrukcijas ar kondensāta bojājumiem.

Būvniecības valsts kontroles birojs pēc pārbaudes uzdeva⁷² triju mēnešu laikā veikt bojāto konstrukciju tehnisko apsekošanu ar atsegšanas metodi, izpētes atzinumā norādot, vai ēka ir droša turpmākajai ekspluatācijai, un sagatavot priekšlikumus par konstatēto nepilnību novēršanu. Par izpētes rezultātu jāinformē Būvniecības valsts kontroles birojs.

Būvniecības valsts kontroles birojs 04.11.2015. aicināja Veselības ministriju sniegt skaidrojumu par atzinumā konstatētajiem apstākļiem, bet Veselības ministrija⁷³ viedokli par norādītajiem apstākļiem uzdeva sniegt PSKUS un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi", jo PSKUS ar 01.01.2016. pārņēma slimnīcas ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas. Atbildes vēstulē Būvniecības valsts kontroles birojam sniegta šāda informācija:

- ❖ sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" informēja⁷⁴ par plānotajiem būvdarbiem līdz 31.12.2015. atbilstoši apstiprinātajiem darba apjomiem un tāmēm;
- ❖ PSKUS piekrita⁷⁵ Būvniecības valsts kontroles biroja ēku stāvokļa novērtējumam ar "2" (konstatētas atkāpes no prasībām, kas ietekmē ēku drošību) un informēja, ka esošā budžeta ietvaros ir ieplānots veikt daļu no atzinumā norādītajiem darbiem. Vēstulē arī norādīts, ka esošo trūkumu novēršanai nepieciešami naudas ieguldījumi, par ko informēta ēku īpašniece – Veselības ministrija.

20.01.2016. Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz 15.09.2015. atzinumā⁷⁶ par publiskās ēkas ekspluatācijas pārbaudi konstatēto, pieņēma lēmumu⁷⁷ uzdot ēkas īpašniecei – Veselības ministrijai – veikt šādus pasākumus:

- ❖ sešu mēnešu laikā jeb līdz 21.07.2016. novērst bīstamību ēkas lietotājiem un garāmgājējiem, uzstādot aizsargbarjeras ap visām gaismas bedrēm, iesniegt birojā bīstamības novēršanu apliecināšu dokumentāciju;
- ❖ gada laikā jeb līdz 21.01.2017. veikt bojāto ēkas pārsegumu, nesošo sienu un jumta nesošo konstrukciju tehnisko izpēti un iesniegt birojā tehniskās izpētes atzinumu. Tehniskajā izpētē jānosaka konstrukciju tehniskais stāvoklis, to ekspluatācijas pieļaujamība un jāsniedz priekšlikumi bojājumu novēršanai.

14.11.2016. Būvniecības valsts kontroles birojs, veicot atkārtotu ēkas ekspluatācijas pārbaudi⁷⁸, konstatēja, ka bīstamība ēkas lietotājiem un garāmgājējiem nav novērsta, kā arī nav veikta ēkas tehniskā apsekošana. PSKUS ēkas ekspluatācijas pārbaudes laikā sniedza informāciju⁷⁹, ka notiek iepirkums ēkas tehniskās apsekošanas veikšanai.

30.12.2016. Būvniecības valsts kontroles birojs ēkas īpašniecei – Veselības ministrijai – izteica brīdinājumu⁸⁰ par administratīvo aktu piespiedu izpildi, nosakot labprātīgi līdz 01.06.2017. izpildīt

un novērst bīstamības un veikt ēkas tehnisko izpēti. Tomēr 17.10.2017. Būvniecības valsts kontroles birojs, veicot ārpuskārtas pārbaudi, konstatēja⁸¹, ka arvien ēkas tehniskā apsekošana nav veikta, nav veikti pasākumi balkonu stiebrojuma aizsargslāņa atjaunošanai, nav veikti pasākumi jumta dzegas konstrukcijas bojājumu novēršanai.

Tostarp PSKUS Būvniecības valsts kontroles birojam sniedza informāciju par noslēgto līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LBS-Konsultants"⁸² (turpmāk – SIA "LBS-Konsultants") par visu slimnīcas korpusu tehnisko apsekošanu, plānojot, ka 2018.gada maijā tiks sagatavoti visu ēku tehniskās apsekošanas atzinumi.

19.02.2018. PSKUS informēja⁸³ Būvniecības valsts kontroles biroju par veiktajiem pagaidu pasākumiem bīstamības novēršanai, norādot, ka PSKUS 2018.gada budžetā un iepirkumu plānā ir paredzēta 15.korpusa jumta seguma nomaiņa, kuras ietvaros plānots veikt jumta dzegu stiprināšanu un noteku atjaunošanu (plānotais termiņš trūkumu novēršanai 01.03.2019.).

Pamatojoties uz iepriekš minēto, 03.04.2018. Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēma lēmumu⁸⁴, ar kuru Veselības ministrijai kā ēkas īpašniecei noteica pienākumus:

- ❖ līdz 01.11.2018. veikt ēkas pārsegumu, nesošo sienu un jumta nesošo konstrukciju tehnisko izpēti un iesniegt birojā tehniskās izpētes atzinumu;
- ❖ līdz 01.03.2019. atjaunot vai pārbūvēt ēkas balkonu nesošās konstrukcijas un iesniegt būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā apliecināšu dokumentāciju, kā arī aizliegt visu ēkas balkonu ekspluatāciju līdz balkonu nesošo konstrukciju atjaunošanas vai pārbūves būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanai ekspluatācijā;
- ❖ līdz 01.03.2019. ēkas īpašniekam atjaunot ēkas jumta dzegas konstrukciju, novēršot izdrupušo ķieģeļu un atslāņojušos apdares slāņu nokrišanas iespēju, un iesniegt bīstamības novēršanu apliecināšu būvniecības dokumentāciju;
- ❖ uzturēt atbilstošu norobežojumu ap ēku vietās, kur iespējama balkonu un jumta dzegas konstrukcijas elementu nokrišana, līdz tiek pabeigti attiecīgi būvdarbi un novērsta bīstamība.

Tikai 03.09.2018. jeb trīs gadus pēc Būvniecības valsts kontroles biroja sniegtā atzinuma⁸⁵ par nepieciešamību ēkas bojātajām konstrukcijām obligāti veikt tehnisko apsekošanu ar atsegšanas metodi, PSKUS iesniedza⁸⁶ Būvniecības valsts kontroles birojam SIA "LBS-Konsultants" izstrādāto tehnisko apsekošanas atzinumu⁸⁷.

Tehniskās apsekošanas atzinumā⁸⁸ 15.korpusa jumta elementu – nesošās konstrukcijas, jumta klāja, jumta seguma, lietusūdens novadsistēmas – tehniskais nolietojums ir novērtēts ar 60%. Atzinumā⁸⁹ ir arī norādīts, ka "kopumā ēka uzturēta nepienācīgi un atstātas novārtā daudzas ēkas svarīgas detaļas, piemēram, fasāde, logi, lielākā daļa jumta", savukārt secinājumu un ieteikumu daļā⁹⁰ attiecībā uz jumta elementiem tika norādīts izvērtēt iespēju tuvāko gadu laikā veikt jumta seguma nomaiņu un veikt jumta remonta darbus, kā arī novērst jumta nehermētiskumu u.c.

Savukārt par 15.korpusa balkonu un lodžiju tehnisko stāvokli atzinumā⁹¹ norādīts, ka ilgstošas apkārtējās vides iedarbībā un nepietiekošas apsaimniekošanas dēļ tas ir neapmierinošs, balkoni un lodžijas ir ievērojami nolietojušies (tehniskais nolietojums ir 50%), bojāti no mitruma, to sijas sākušas korodēt vai arī korodējušas.

03.09.2018. PSKUS informēja⁹² Būvniecības valsts kontroles biroju par daļēju uzdoto darbu izpildi, norādot, ka ēkas balkonu ekspluatācija ir aizliegta, vietas ap ēku, kur iespējama balkonu un jumta

dzegas konstrukcijas elementu nokrišana, ir norobežotas. PSKUS vēstulē arī norādīja, ka 2019.gadā ir plānots uzsākt 15.korpusa jumta atjaunošanas darbus.

2019.gada beigās Būvniecības valsts kontroles birojs aicināja⁹³ Veselības ministriju pirms administratīvā akta piespiedu izpildes procesa uzsākšanas līdz 20.01.2020. sniegt informāciju par Būvniecības valsts kontroles biroja 03.04.2018. lēmuma⁹⁴ izpildes gaitu, pievienojot attiecīgu dokumentāciju vai foto fiksāciju.

21.01.2020. PSKUS atbildē⁹⁵ Būvniecības valsts kontroles birojam norādīts, ka 20.02.2019. ir noslēgts līgums ar pilnsabiedrību "Lūsis V un MV Būveksperti"⁹⁶ par 15.korpusa ēkas jumta seguma nomaiņas, jumta dzegas atjaunošanas un balkonu atjaunošanas projektēšanu un 14.01.2020. izstrādātais projekts nodots ekspertīzes veikšanai⁹⁷.

Vienlaikus PSKUS informēja, ka atbilstoši slimnīcas budžeta iespējām 2020.gadā paredzēts veikt balkonu un dzegas atjaunošanu, bet 2021.gadā, ja tas būs finansiāli iespējams, tiks turpināts darbs pie ēkas jumta seguma nomaiņas. Atjaunošanas darbiem nepieciešamos publiskos iepirkumus plānots organizēt 2020.gada pirmajā ceturksnī. Ņemot vērā minēto, PSKUS lūdza⁹⁸ Būvniecības valsts kontroles biroju līdz 01.06.2022. pagarināt termiņu 2015.gadā konstatēto bīstamību novēršanai 15.korpusā. Būvniecības valsts kontroles birojs secināja, ka pastāv tiesisks pamats piespiedu izpildes procesa atlikšanai līdz 01.06.2022. Laika nogriezni par PSKUS veiktajām darbībām skatīt 2.attēlā.

11.12.2015. PSKUS vēstule BVKB	19.02.2018. PSKUS vēstule BVKB	03.09.2018. PSKUS vēstule BVKB	21.01.2020. PSKUS vēstule BVKB
<ul style="list-style-type: none"> • PSKUS piekrita ēkas stāvokļa vērtējumam ar "2"; • esošā budžeta ietvaros ir ielānots veikt daļu no BVKB atzinumā norādītajiem darbiem; • esošo trūkumu novēršanai nepieciešami naudas ieguldījumi, par ko informēta ēku īpašniece – Veselības ministrija. 	<ul style="list-style-type: none"> • PSKUS plāno 2018.gada budžeta ietvaros veikt ēkas jumta seguma nomaiņu, kuras ietvaros plānots veikt jumta dzegu stiprināšanu un noteku atjaunošanu; • remontdarbu termiņš – 01.03.2019. 	<ul style="list-style-type: none"> • PSKUS iesniedz BVKB 15.korpusa tehniskās apsekošanas aktu; • tehniskās apsekošanas aktā sniegts ieteikums veikt 15.korpusa jumta seguma nomaiņu; • PSKUS informē BVKB par plāniem 2019.gadā uzsākt 15.korpusa jumta atjaunošanas darbus, lai novērstu bīstamību slimnīcas 15.korpusā. 	<ul style="list-style-type: none"> • PSKUS atbilstoši slimnīcas budžeta iespējām plāno 2020.gadā veikt balkonu un dzegas atjaunošanu; • 2021.gadā, ja tas būs finansiāli iespējams, PSKUS turpinās darbu pie ēkas jumta seguma nomaiņas; • publiskos iepirkumus PSKUS plāno organizēt 2020.gada pirmajā ceturksnī.



Rezultāts: četrus gadus PSKUS neveica plānotos remontdarbus BVKB konstatēto bojājumu novēršanai---> MK 05.05.2020. atbalstīja finansējuma piešķiršanu plānotajiem remontdarbiem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

2.attēls. PSKUS remontdarbi Būvniecības valsts kontroles biroja konstatēto bojājumu PSKUS 15.korpusā novēršanai laika posmā no 2015.gada līdz 2020.gadam.

Pārbaudes laikā Veselības ministrija apstiprināja⁹⁹, ka par PSKUS 15.korpusa tehnisko stāvokli Veselības ministrijai ir zināms no Būvniecības valsts kontroles biroja vēstulēm, jo Veselības ministrijai kā ēkas īpašniecei primāri tiek adresētas visas vēstules, atzinumi un lēmumi, kas attiecināmi uz ēkas tehnisko stāvokli.

Starpziņojuma saskaņošanas laikā Veselības ministrija sniedza viedokli¹⁰⁰:

Ministru kabineta rīkojuma projekts netika virzīts steidzamības kārtībā saistībā ar Covid-19, bet bija nepieciešams nodrošināt funkciju īstenošanu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību koronavīrusa "Covid-19" uzliesmojumu laikā. 2020.gada 14.martā stipra vēja ietekmē PSKUS 15.korpusa jumtam (6 stāvu ēka, kurā visos stāvos izvietotas ārstniecības funkcijas, t.sk. operāciju bloki un intensīvā terapija) tika norauts jumta segums aptuveni ~60 m² platībā. Lai ārējo apstākļu dēļ netiktu nodarīti bojājumi ēkas bēniņu stāva pārsegumam un augšējo stāvu telpām, nekavējoties, tajā pašā dienā, tika organizēti pagaidu remonta darbi, un bojātā vieta nosepta ar plēvi. Ievērojot jumta seguma, siju un latojuma stāvokli, pastāv reāls risks, ka stipra vēja ietekmē jumts tiks bojāts atkārtoti vai pat pilnībā norauts, turklāt bojājumu apmēru nav iespējams prognozēt, attiecīgi, nav iespējams prognozēt, vai jumta seguma bojājumu dēļ nebūs jāpārtrauc ārstniecības funkcijas šī korpusa augšējos stāvos vai visā korpusā.

Saskaņā ar starpziņojuma saskaņošanas laikā PSKUS sniegto informāciju¹⁰¹ 11.06.2020. spēcīga vēja un stipra lietus apstākļos pagaidu (plēves) jumta daļa tika bojāta un Dzemdību nodaļā, kas izvietota 15.korpusa sestajā stāvā, sāka ieplūst lietus ūdens, un slimnīca steidzami organizēja nodaļas pacientu izvietošanu citās telpās, lai arī šādas iespējas saistībā ar Covid-19 bija ierobežotas. Arī 18.09.2020. stiprā vēja ietekmē tika norauts vēl viens posms 15.korpusa jumta segumā ~ 50 m² platībā, radot riskus ēkas ekspluatācijas drošībai.

Remontdarbu veikšanai nepieciešamais finansējums

Revidenti secina, ka PSKUS 15.korpusa remontdarbi bija iepriekš paredzēti, jo slimnīca jau pirms ārkārtējās situācijas veica pasākumus šo remontdarbu īstenošanai un 2020.gadā bija tam paredzējusi finansējumu 500 000 euro.

Revidentu ieskatā, avārijas situācija, kad vētras dēļ tika bojāts PSKUS 15.korpusa jumts ~60 m² platībā, nav pietiekams pamatojums piešķirt finansējumu citiem, jau iepriekš paredzētiem PSKUS remontdarbiem, tai skaitā arī visa jumta 3553 m² platībā remontam.


Pārbaudes laikā konstatētais liecina, ka iepirkumu rezultātā noslēgtajiem līgumiem nepieciešams par 77% lielāks finansējums nekā piešķirts no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kuru PSKUS nodrošinās no saviem līdzekļiem.

Finansējuma pieprasījuma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pamatojums

Finansējums no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 664 221 euro apmērā tika piešķirts¹⁰² 15.korpusa visa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas nomaiņai. Kā pamatojums finansējuma nepieciešamībai¹⁰³ ir norādīts fakts, ka 2020.gada martā stiprā vējā tika norauts PSKUS 15.korpusa jumta segums aptuveni 60 m² platībā, un risks, ka, ņemot vērā slikto jumta seguma, siju un latojuma stāvokli, stipra vēja ietekmē jumts var tikt bojāts atkārtoti vai pat pilnībā norauts. Rīkojuma anotācijā ir atsauce arī uz Būvniecības valsts kontroles biroja 03.04.2018. lēmumu¹⁰⁴ uzdot ēkas īpašnieci – Veselības ministrijai – pienākumu līdz 01.03.2019. atjaunot vai pārbūvēt ēkas balkonu nesošās konstrukcijas.

Lai gan par 15.korpusa jumta seguma slikto tehnisko stāvokli slimnīcai bija zināms jau pirms četriem gadiem, pārbaudes laikā PSKUS revidenti norādīja¹⁰⁵, ka, PSKUS ieskatā, avārijas stāvoklis jumtam ir izveidojies tieši 14.03.2020., kad laika apstākļu ietekmē tika norauts jumta segums ~60 m² platībā, kas ir vien 1,7% no kopējā visa 3553 m² jumta seguma.

Pārbaudes laikā Veselības ministrija revidentiem iesniedza PSKUS vēstuli¹⁰⁶, kurā norādīts aptuvenais bojājumu apmērs, un pielikumā foto fiksāciju 14.03.2020. jumta bojājumiem (trīs fotogrāfijas bez apraksta, skatīt 3.attēlu).

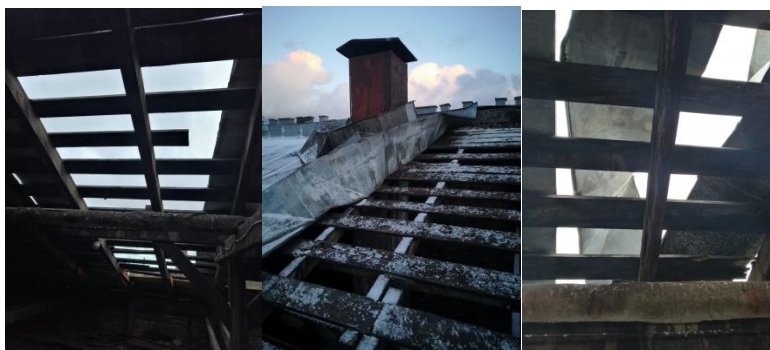

3.attēls. Foto fiksācija 14.03.2020. 15.korpusa jumta bojājumiem.

Turklāt visa jumta 3553 m² konstrukciju un seguma nomainai plānots izlietot 58% no kopējā ar Ministru kabineta lēmumu¹⁰⁷ atbalstītā finansējuma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Pārējos 42% finansējuma plānots izlietot citām pozīcijām, tai skaitā balkonu un ārējo metāla kāpņu atjaunošanai, iekšējo elektrotīklu un ventilācijas kanālu atjaunošanai (skatīt 1.tabulu).

Starpziņojuma saskaņošanas laikā PSKUS sniedza viedokli¹⁰⁸, ka, izņemot balkonu un ārējo metāla kāpņu atjaunošanas darbus, pārējie darbi ir tiešā veidā saistīti ar jumta nomaini un, PSKUS ieskatā, ir nesaimnieciski un finansiāli nesaprātīgi veikt tikai jumta seguma nomaini, neveicot visus saistītos darbus – jumta nesošo, iztrupējušo konstrukciju nomaini, ventilācijas sistēmas sakārtošanu, bēniņu stāva energoefektivitātes paaugstināšanu u.c.

1.tabula

Papildus nepieciešamais finansējums PSKUS 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas nomainai¹⁰⁹

Pozīcija	Euro, ieskaitot PVN	% no kopējā finansējuma
Balkonu un ārējo metāla kāpņu atjaunošana	35 039	5%
3553 m ² jumta seguma un citu saistīto lietu demontāža	33 740	5%
~20% jumta nesošo konstrukciju atjaunošana, bēniņu pārseguma siltināšana	64 165	10%
3553 m ² jumta seguma atjaunošana, lietussūdens noteksisstēmas atjaunošana, jumta elementu un sniega barjeru uzstādīšana	224 752	34%
Karnīzes, parapeta, ailu un lūku atjaunošana	62 465	9%
Iekšējo elektrotīklu un zibens aizsardzības sistēmas atjaunošana	63 726	10%
Ventilācijas kanālu un galveno izvadu atjaunošana	77 563	12%
Virsizdevumi 13,3%, tajā skaitā darba aizsardzība	74 675	11%
Būvuzņēmēja peļņa	28 096	4%

Kopā	664 221	100%
-------------	----------------	-------------


Jāmin, ka PSKUS jau 20.02.2019. noslēdza līgumu¹¹⁰ par 15.korpusa ēkas jumta seguma nomaiņas, jumta dzegas atjaunošanas un balkonu atjaunošanas projektēšanu, līdz ar to PSKUS sākotnēji 2020.gada budžetā iepiļanoja nepieciešamo finansējumu aptuveni 500 000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa)¹¹¹.

Pārbaudē noskaidrots, ka PSKUS jau 03.04.2020. jeb mēnesi pirms Ministru kabineta lēmuma par finansiāla atbalsta sniegšanu izdeva rīkojumu¹¹² par būvdarbu iepirkuma uzsākšanu.

Starpziņojuma saskaņošanas laikā PSKUS skaidroja¹¹³, ka slimnīca, ievērojot augsto risku pacientu un personāla drošībai, savlaicīgi uzsāka veikt visas nepieciešamās darbības būvdarbu veikšanai. Ņemot vērā situācijas bīstamību, slimnīca, valsts budžeta līdzekļu nepiešķiršanas gadījumā, meklētu alternatīvus risinājumus.

Plānoto darbu veikšanai faktiski nepieciešamais finansējums

Pārbaudes laikā, analizējot izdevumu tāmes¹¹⁴ ar noteiktiem būvdarbu apjomiem kopsakarā ar iepirkumu tehnisko specifikāciju, konstatēts, ka no PSKUS sākotnēji pieprasītā finansējuma apjoms ir nepietiekams, jo iepirkums noslēdzies ar pretendentu finanšu piedāvājumiem, kas abos gadījumos pārsniedz paredzamo līgumcenu un no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbalstīto finansējumu līdz pat 2,5 reizēm (skatīt 4.attēlu):

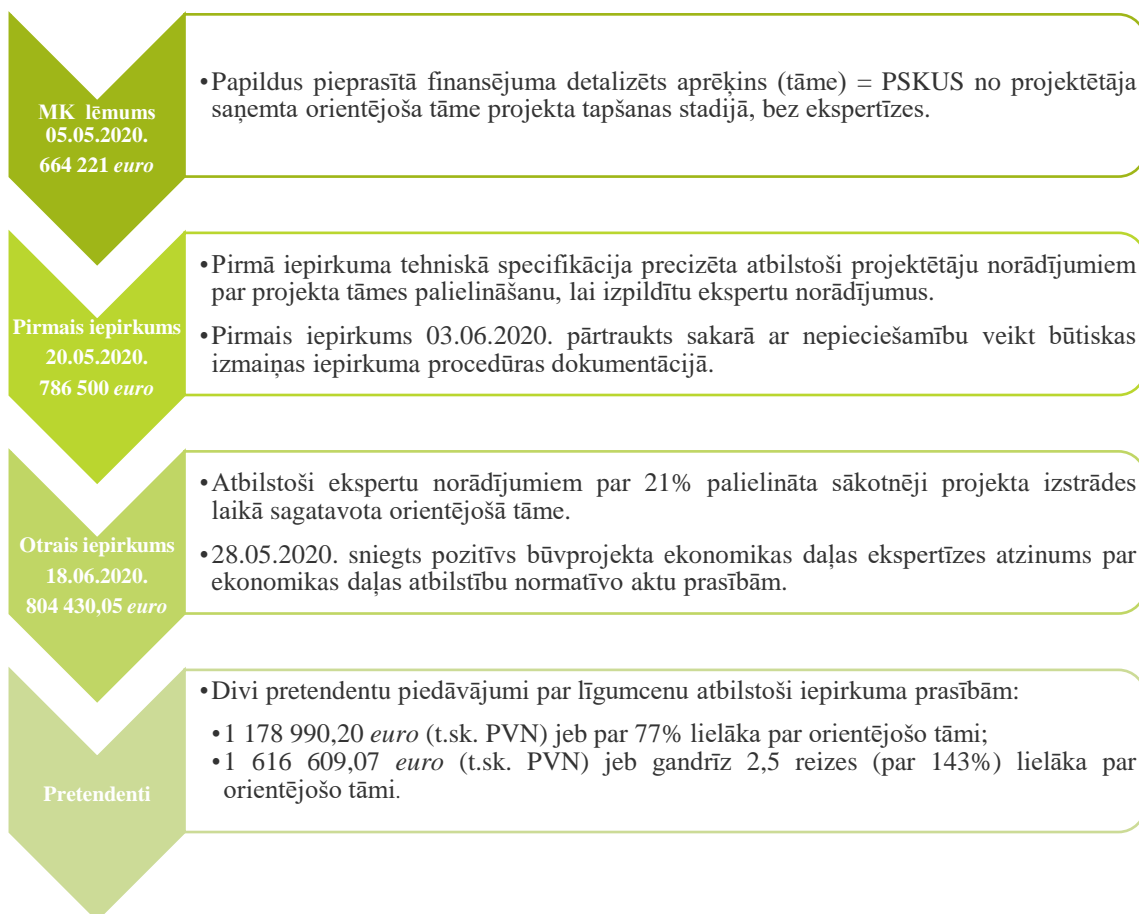

4.attēls. Būvdarbi un to apjoms tehniskā projekta, papildu finansējuma pieprasījuma un abu iepirkumu dokumentācijā.

21.08.2020. PSKUS iepirkumu komisija lēma¹¹⁵ par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "ARGUS"¹¹⁶ (turpmāk – SIA "ARGUS"), 18.09.2020. PSKUS un SIA "ARGUS" noslēdza līgumu¹¹⁷ par kopējo summu 974 372,07 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) ar darbu izpildes termiņu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā.

Vienlaikus PSKUS informēja¹¹⁸, ka starpību¹¹⁹ starp līgumcenu un valsts pieejamo atbalstu plāno segt no PSKUS pašu līdzekļiem, pārskatot savas vajadzības. Jāmin, ka atbilstoši PSKUS sniegtajai informācijai¹²⁰ 2020.gadā darbus pilnā apmērā paveikt nebūs iespējams, jo līdz gada beigām tik apjomīgam objektam triju mēnešu termiņš ir ļoti īss, tomēr atbilstoši darba veicēja iesniegtajam¹²¹ plānoto darbu izpildes grafikam un plānotajai finanšu plūsmai plānots paveikt lielāko daļu darba un apgūt piešķirto finansējumu 664 221 euro apmērā, šādi novēršot situāciju par remontdarbiem neizmantoto valsts budžeta līdzekļu atmaksu valsts budžetā.

Veselības ministrija norādīja¹²², ka pēc finansējuma piešķiršanas PSKUS 15.korpusa jumta seguma un balkonu nesošās konstrukcijas nomaiņai, Nacionālais veselības dienests slēgs līgumu ar PSKUS, kurā tiks noteikta kārtība, kādā tiek iesniegti apliecinājoši dokumenti par finansējuma izlietojumu atbilstoši piešķiruma mērķim un atmaksas kārtība, ja tas netiek sasniegts.

Ieteikums

Lai sekmētu valsts budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, pirms virzīt finansējuma pieprasījumus no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" izskatīšanai Ministru kabinetā, izvērtēt pieprasījuma konkrēta pasākuma finansēšanai pamatotību un vispusīgi apzināt informāciju par kopējiem nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un to avotu šī pasākuma pilnvērtīgai pabeigšanai.

Revīzijas raksturojums

Revīzijas mērķis

Revīzijas mērķis ir pārbaudīt gada pārskatu – vai konsolidētais 2020.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un ministrijas darbības finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 31.12.2020., un vai tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Revīzijas mērķis ietver pārbaūžu veikšanu par papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotību, ko Valsts kontrole ir izvirzījusi par galveno revīzijas jautājumu 701.starptautiskā revīzijas standarta "Ziņošana par galvenajiem revīzijas jautājumiem neatkarīga revidenta ziņojumā" izpratnē.

Šajā starpziņojumā ir apkopota informācija par veikto pārbaudi Veselības ministrijā par papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījuma pamatotību.

Juridiskais pamatojums

Pārbaude veikta un starpziņojums sagatavots finanšu revīzijas "Par Veselības ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību" ietvaros (Valsts kontroles Trešā departamenta 27.04.2020. revīzijas grafiks Nr.2.4.1-9/2020) un pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 3.panta 3.punkta c) apakšpunktu.

Revidentu atbildība

Valsts kontrole ir atbildīga par revīzijas vadību, pārraudzību, veikšanu, starpziņojuma sagatavošanu, kas pamatojas uz revīzijas laikā gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem. Revīzija veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Saskaņā ar šiem standartiem revīzijas grupa ievēro ētikas prasības un pārbaudi plāno un veic, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījums ir pamatots.

Veselības ministrijas atbildība

Veselības ministrija ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījums ir pamatots.

Revīzijas apjoms

Valsts kontrole veica pārbaudes procedūras par papildu 1 323 563 *euro* apmērā piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījuma pamatotību.

Valsts kontrole vērs uzmanību, ka, tā kā pārbaudes laikā remontdarbi nebija pabeigti, pārbaudē netika vērtēts paredzētā finansējuma izlietojums, ko, savukārt, veiks Nacionālais veselības dienests pēc remontdarbu pabeigšanas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un atbilstoši dokumentiem par finansējuma izlietojumu piešķiruma mērķim.

Šajā starpziņojumā norādītā informācija par galveno revīzijas jautājumu – papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotība – apkopotā veidā tiks iekļauta arī Valsts kontroles ziņojumā un atzinumā par Veselības ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību, kā arī tiks izmantota finanšu revīzijā par "Par Latvijas Republikas 2020.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem".

Sektora vadītāja p.i.

S.Batalova

Departamenta direktore

I.Vārava

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Atsauces

- ¹Starptautiskos revīzijas standartus finanšu revīziju jomā izmanto arī Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija (INTOSAI), līdz ar to tie ir saistoši Valsts kontrolei, kas veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem.
- ²Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojums Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".
- ³Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojums Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".
- ⁴Valsts prezidenta 23.03.2020. paziņojums Nr.8 "Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā".
- ⁵Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai, izskatīts Ministru kabineta 19.05.2020. sēdē.
- ⁶Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēdes 31.01.2020. protokols. Pieejams: <https://www.vm.gov.lv/lv/media/2635/download>, skatīts 03.08.2020.
- ⁷Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēdes 31.01.2020. protokols. Pieejams: <https://www.vm.gov.lv/lv/media/2635/download>, skatīts 03.08.2020.
- ⁸SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 2019.gada pārskats. Pieejams: https://www.aslimnica.lv/sites/default/files/editor/2019_gada_parskats.pdf, skatīts 11.08.2020.
- ⁹SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020".
- ¹⁰Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēdes 23.03.2020. protokols. Pieejams: <https://www.vm.gov.lv/lv/media/2599/download>, skatīts 17.08.2020.
- ¹¹VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 29.07.2020. vēstule Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020".
- ¹²Atbilstoši VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 01.12.2020. vēstulei Nr. 5-1.2/1802 "Par apkopotās informācijas saskaņošanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" laika posmā no 12.03.2020. līdz 8.06.2020. (Covid-19 vīrusa izplatības pirmais vilnis Latvijā) slimnīcā dažādos ārstniecības profilos kopumā nonāca 11 Covid-19 pozitīvi pacienti.
- ¹³Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.punkts (zaudējis spēku no 10.06.2020.).
- ¹⁴Atbilstoši VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 01.12.2020. vēstulei Nr. 5-1.2/1802 "Par apkopotās informācijas saskaņošanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" slimnīcā tika pārorganizēta pacientu plūsma, ievērojot triju metru distances attālumu starp pacientu gultas vietām, divu metru distances attālumu starp pārējiem pacientiem, maksimāli nodalot ambulatoro un stacionāro pacientu plūsmas.
- ¹⁵VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" gada pārskats par 2019.gadu, apstiprināts 30.04.2020. Pieejams: http://www.stradini.lv/sites/default/files/editor/GP_2019.pdf, skatīts 17.08.2020.
- ¹⁶VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 01.12.2020. vēstule Nr. 5-1.2/1802 "Par apkopotās informācijas saskaņošanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020".
- ¹⁷Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.237 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
- ¹⁸Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.237 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"". Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/314475-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem>, skatīts 03.08.2020.
- ¹⁹Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.237 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
- ²⁰Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.237 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"". Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/314475-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem>, skatīts 03.08.2020.
- ²¹SIA "PRO VIA" vienotais reģistrācijas numurs 40003372696.
- ²²Ministru kabineta 02.07.2019. rīkojums Nr.327 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"". Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: <http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40474498>, skatīts 13.06.2020.
- ²³SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstulē Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" norādīts, ka 09.04.2013. tika noslēgts līgums ar SIA "WESEMANN" (vienotais reģistrācijas numurs 40003140237) par kopējo līgumsummu 265 716,74 LVL (bez pievienotās vērtības nodokļa); Latvijas oficiālais maiņas kurss 1 euro = 0,702804 LVL.
- ²⁴Ar SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstuli Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts SIA "PRO VIA" 27.03.2019. tehniskās apsekošanas atzinums "Stacionāra "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ēkas, kadastra Nr.01006220010, Hipokrāta iela 4, Rīga".
- ²⁵SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020". SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāra "Latvijas onkoloģijas centrs" korpusi – A, B, D, E, G, I, K, L, M, V, Z.

- ²⁶Ar SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstuli Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegta SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Rīgas pilsētas būvvaldei adresēta Apliecinājuma karte inženierbūvēm.
- ²⁷Ministru kabineta 02.07.2019. rīkojums Nr.327 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
- ²⁸Veselības ministrijas 31.08.2020. un 03.09.2020. e-pasta vēstules; Ar Veselības ministrijas 03.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegta SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 16.04.2019. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/19/658 "Par Latvijas Onkoloģijas centra ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu stāvokli".
- ²⁹Ar Veselības ministrijas 03.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegta SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 16.04.2019. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/19/658 "Par Latvijas Onkoloģijas centra ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu stāvokli".
- ³⁰Iepirkuma identifikācijas Nr.RAKUS 2019/51K "Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve". Pieejams: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23204>, skatīts 04.08.2020.
- ³¹Ar SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 25.09.2020. vēstuli Nr.A1/1.1-07/20/1924 "Par informācijas sniegšanu finanšu revīzijas Nr.2.4.1-9/2020 ietvaros" Valsts kontrolei iesniegta Veselības ministrijas 09.07.2019. vēstule Nr.01-16.2/2904 Par Ministru kabineta rīkojumu Nr.327 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
- ³²Ministru kabineta 02.07.2019. rīkojums Nr.327 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
- ³³SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāra "Latvijas onkoloģijas centrs" korpusi – K, L, Z, I.
- ³⁴SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.11.2020. vēstule Nr. A1/1.1-07.1/20/2286 "Par faktu apkopojumu finanšu revīzijas Nr.2.4.1-9/2020 ietvaros".
- ³⁵Ar Veselības ministrijas 03.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegta SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 16.04.2019. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/19/658 "Par Latvijas Onkoloģijas centra ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu stāvokli".
- ³⁶Ministru kabineta 15.12.2009. instrukcijas Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 2.punkts.
- ³⁷SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020".
- ³⁸Iepirkuma identifikācijas Nr.RAKUS 2019/51K "Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve". Pieejams: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23204>, skatīts 04.08.2020. Iepirkuma identifikācijas Nr.RAKUS 2019/64M "Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ēkas pagraba stāva inženierkomunikāciju atjaunošanas (pārbūves) autoruzraudzība". Pieejams: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/25350>, skatīts 04.08.2020. Iepirkuma identifikācijas Nr.RAKUS 2019/65M "Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ēkas pagraba stāva inženierkomunikāciju atjaunošanas (pārbūves) būvuzraudzība". Pieejams: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24999>, skatīts 04.08.2020.
- ³⁹Iepirkuma identifikācijas Nr.RAKUS 2019/51K "Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve". Pieejams: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23204>, dokuments "Līgums_AKN" (vienotais reģistrācijas numurs 40103568595), skatīts 07.09.2020.
- ⁴⁰Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L4 & MŪSU UZRAUGS", vienotais reģistrācijas numurs 40203155752.
- ⁴¹SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020".
- ⁴²Ministru kabineta 02.07.2019. rīkojums Nr.327 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
- ⁴³SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020".
- ⁴⁴SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.11.2020. vēstule Nr. A1/1.1-07.1/20/2286 "Par faktu apkopojumu finanšu revīzijas Nr.2.4.1-9/2020 ietvaros".
- ⁴⁵Iepirkuma identifikācijas Nr.RAKUS 2019/51K "Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve". Pieejams: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23204>, dokuments "Līgums_AKN", skatīts 07.09.2020.
- ⁴⁶Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 155.punkts.
- ⁴⁷SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020".
- ⁴⁸SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020".
- ⁴⁹Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojums Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (zaudējis spēku no 10.06.2020.).
- ⁵⁰Ministru kabineta 23.04.2020. rīkojuma Nr.218 "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 1.4.punkts (zaudējis spēku no 10.06.2020.). Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/314256-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-12-marta-rikojuma-nr-103-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu->, skatīts 17.08.2020.
- ⁵¹Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.punkts (zaudējis spēku no 10.06.2020.).
- ⁵²SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 08.04.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/669 "Par finansējuma nepieciešamību Latvijas Onkoloģijas centra ārkārtas situācijas risināšanai".

⁵³Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.237 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"". Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486938&mode=mk&date=2020-05-05>, skatīts 13.06.2020.

⁵⁴Ministru kabineta 02.07.2019. rīkojums Nr.327 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"". Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486938&mode=mk&date=2020-05-05>, skatīts 13.06.2020.

⁵⁵SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020".

⁵⁶SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020". Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.237 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"". Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486938&mode=mk&date=2020-05-05>, skatīts 13.06.2020.

⁵⁷Ministru kabineta 02.07.2019. rīkojums Nr.327 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"". Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: <http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40474498>, skatīts 13.06.2020.

⁵⁸SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020". SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 07.02.2020., 24.02.2020., 29.03.2020., 31.03.2020., 14.06.2020. akti "Par ūdensapgādes maģistrālo cauruļvadu avāriju stacionārā "Latvijas Onkoloģijas centrs"". SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Enerģodienesta daļas sanitārtehniskā inženiera dienesta 01.10.2018., 02.01.2019., 01.02.2019. ziņojumi.

⁵⁹SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020".

⁶⁰SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020".

⁶¹SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020"; SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 25.09.2020 vēstule Nr. A1/1.1-07/20/1924 "Par informācijas sniegšanu finanšu revīzijas Nr.2.4.1-9/2020 ietvaros".

⁶²SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ar pilnsabiedrību "AKN" 20.05.2020. noslēgtā "Vienošanās Nr.1 pie 2019.gada 28.augusta līguma Nr.B8-2019/441 par stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvi". Pieejams: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23204>, dokuments "Vienošanas_1", skatīts 07.09.2020.

⁶³SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 30.07.2020. vēstule Nr.A1/1.1-07.1/20/1585 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020".

⁶⁴Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstule; Veselības ministrijas 22.09.2020. e-pasta vēstule.

⁶⁵Atbilstoši Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstulē norādītajam Nacionālais veselības dienests ar SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 29.11.2019. un 04.08.2020. noslēdza līgumus par stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ūdensapgādes sistēmas atjaunošanas izdevumu segšanu.

⁶⁶Atbilstoši Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstulē norādītajam – Nacionālā veselības dienesta ar SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 04.08.2020. noslēgtā līguma Nr.NVD-2/12-2020 par stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ūdensapgādes sistēmas atjaunošanas izdevumu segšanu 3.4.apakšpunkts.

⁶⁷Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.237 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"". Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/314475-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzeties-gadījumiem>, skatīts 03.08.2020.

⁶⁸Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.237 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"". Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/314475-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzeties-gadījumiem>, skatīts 03.08.2020.

⁶⁹Publiska ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 056 0115 015, Pilsoņu ielā 13 k-15, Rīgā.

⁷⁰Būvniecības likuma 6.panta septītā daļa.

⁷¹Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 29.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 15.09.2015. atzinums Nr.50-2.1/2015/157-0070 par publiskas ēkas ekspluatācijas pārbaudi.

⁷²Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 29.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 15.09.2015. atzinums Nr.50-2.1/2015/157-0070 par publiskas ēkas ekspluatācijas pārbaudi.

⁷³Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 29.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 20.01.2016. lēmums Nr.4-2-16/14 "Par bīstamības novēršanu un tehniskās izpētes veikšanu 15.korpusā Pilsoņu ielā 13, Rīgā".

⁷⁴Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 29.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 20.01.2016. lēmums Nr.4-2-16/14 "Par bīstamības novēršanu un tehniskās izpētes veikšanu 15.korpusā Pilsoņu ielā 13, Rīgā".

⁷⁵Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 29.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 20.01.2016. lēmums Nr.4-2-16/14 "Par bīstamības novēršanu un tehniskās izpētes veikšanu 15.korpusā Pilsoņu ielā 13, Rīgā". VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 11.12.2015. vēstule Nr.5.1-1.2/1940 "Par slimnīcas ēku kompleksa Pilsoņu ielā 13, Rīgā ekspluatācijas pārbaudes atzinumu".

- ⁷⁶Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 29.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 15.09.2015. atzinums Nr.50-2.1/2015/157-0070 par publiskas ēkas ekspluatācijas pārbaudi.
- ⁷⁷Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 29.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 20.01.2016. lēmums Nr.4-2-16/14 "Par bīstamības novēršanu un tehniskās izpētes veikšanu 15.korpusā Pilsoņu ielā 13, Rīgā".
- ⁷⁸Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 31.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 14.11.2016. atzinums Nr.4-2/2016/269-3478-E par publiskās ēkas ekspluatācijas pārbaudi.
- ⁷⁹Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 31.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 14.11.2016. atzinums Nr.4-2/2016/269-3478-E par publiskās ēkas ekspluatācijas pārbaudi.
- ⁸⁰Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 31.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 14.11.2016. atzinums Nr.4-2/2016/269-3478-E par publiskās ēkas ekspluatācijas pārbaudi.
- ⁸¹Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 31.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 19.10.2017. atzinums Nr.4-2.1-2017-269-4474 par publiskās ēkas ekspluatācijas pārbaudi.
- ⁸²Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LBS-Konsultants" (vienotais reģistrācijas numurs 40003640250).
- ⁸³Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 23.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegta VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 19.02.2018. vēstule Nr.5-1.2/342 "Par informācijas sniegšanu".
- ⁸⁴Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 31.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 03.04.2018. lēmums Nr.4-2.5-18/134 "Par kāpņu un balkonu ekspluatācijas aizliegšanu un bīstamības novēršanu slimnīcas 15.korpusā Pilsoņu ielā 13, Rīgā un termiņa pagarināšanu 15.korpusa tehniskās izpētes veikšanai".
- ⁸⁵Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 29.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 15.09.2015. atzinums Nr.50-2.1/2015/157-0070 par publiskas ēkas ekspluatācijas pārbaudi.
- ⁸⁶Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 31.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegta VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 03.09.2018. vēstule Nr.5-1.2/1448 "Par informācijas sniegšanu (BVKB lēmumu izpilde)".
- ⁸⁷Ar Veselības ministrijas 02.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegts SIA "LBS-Konsultants" 2017.gada augustā veiktās tehniskās apsekošanas atzinums.
- ⁸⁸Ar Veselības ministrijas 02.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegts SIA "LBS-Konsultants" 2017.gada augustā gatavotais tehniskās apsekošanas atzinums, 4.6.punkts.
- ⁸⁹Ar Veselības ministrijas 02.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegts SIA "LBS-Konsultants" 2017.gada augustā gatavotais tehniskās apsekošanas atzinums, 6.1.punkts.
- ⁹⁰Ar Veselības ministrijas 02.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegts SIA "LBS-Konsultants" 2017.gada augustā gatavotais tehniskās apsekošanas atzinums, 5.2.punkts.
- ⁹¹Ar Veselības ministrijas 02.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegts SIA "LBS-Konsultants" 2017.gada augustā gatavotais tehniskās apsekošanas atzinums, 4.7.punkts.
- ⁹²Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 31.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegta VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas" 03.09.2018. vēstule Nr.5-1.2/1448 "Par informācijas sniegšanu (BVKB lēmumu izpilde)".
- ⁹³Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 31.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegta Būvniecības valsts kontroles biroja 20.12.2019. vēstule Nr.3-2.2/2019/1963-nd "Par informācijas sniegšanu par ēku Pilsoņu ielā 13 k-15, Rīgā".
- ⁹⁴Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 31.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 03.04.2018. lēmums Nr.4-2.5-18/134 "Par kāpņu un balkonu ekspluatācijas aizliegšanu un bīstamības novēršanu slimnīcas 15.korpusā Pilsoņu ielā 13, Rīgā un termiņa pagarināšanu 15.korpusa tehniskās izpētes veikšanai".
- ⁹⁵Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 31.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegta VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 21.01.2020. vēstule Nr.5-1.2/129 "Par informācijas sniegšanu par ēku Pilsoņu ielā 13 k-15, Rīgā".
- ⁹⁶Pilnsabiedrība "Lūsis V un MV Būveksperti", vienotais reģistrācijas numurs 40203068864.
- ⁹⁷Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 31.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegta VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 21.01.2020. vēstule Nr.5-1.2/129 "Par informācijas sniegšanu par ēku Pilsoņu ielā 13 k-15, Rīgā".
- ⁹⁸Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 31.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegta VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 21.01.2020. vēstule Nr.5-1.2/129 "Par informācijas sniegšanu par ēku Pilsoņu ielā 13 k-15, Rīgā".
- ⁹⁹Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstule.
- ¹⁰⁰Veselības ministrijas 02.12.2020. vēstule Nr. 01-15.1/6265 "Par revīzijas "Par Veselības ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas precizību" starpziņojuma projektu nosūtīšanu".

- ¹⁰¹VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 01.12.2020 vēstule Nr.5-1.2/1802 "Par apkopotās informācijas saskaņošanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/202".
- ¹⁰²Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.237 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
- ¹⁰³Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.237 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486938&mode=mk&date=2020-05-05>, skatīts 13.06.2020.
- ¹⁰⁴Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 31.07.2020. vēstuli Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020" Valsts kontrolei iesniegts Būvniecības valsts kontroles biroja 03.04.2018. lēmums Nr.4-2.5-18/134 "Par kāpņu un balkonu ekspluatācijas aizliegšanu un bīstamības novēršanu slimnīcas 15.korpusā Pilsoņu ielā 13, Rīgā un termiņa pagarināšanu 15.korpusa tehniskās izpētes veikšanai".
- ¹⁰⁵VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 29.07.2020. vēstule Nr.5-1.2/1131 "Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/2020".
- ¹⁰⁶Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstule. Ar Veselības ministrijas 02.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegta VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 25.03.2020. vēstule Nr.5-2.2/513 "Par nepieciešamo finansējumu Slimnīcas 15.korpusa jumta nomainīšanai" ar diviem pielikumiem.
- ¹⁰⁷Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.237 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
- ¹⁰⁸VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 01.12.2020 vēstule Nr.5-1.2/1802 "Par apkopotās informācijas saskaņošanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/202".
- ¹⁰⁹Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojums Nr.237 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/314475-par-finansu-lidzeklu-pieskirsanu-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem>, skatīts 03.08.2020.
- ¹¹⁰Pilnsabiedrība "Lūsis V un MV Būveksperti", vienotais reģistrācijas numurs 40203068864.
- ¹¹¹Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 23.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegts projekta ekspertīzes laikā no projektētājiem saņemto tāmju 15.korpusa jumta nomainīšanai un balkonu atjaunošanai uzskaitījums, saskaņā ar kuru slimnīcas 2020.gada budžetā bija iekļauts finansējums 495 867 *euro* (bez pievienotās vērtības nodokļa) jeb 600 000 *euro* (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).
- ¹¹²Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 23.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegts projekta ekspertīzes laikā no projektētājiem saņemto tāmju 15.korpusa jumta nomainīšanai un balkonu atjaunošanai uzskaitījums, saskaņā ar kuru PSKUS 03.04.2020. ir izdevusi rīkojumu par iepirkuma uzsākšanu.
- ¹¹³VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 01.12.2020 vēstule Nr.5-1.2/1802 "Par apkopotās informācijas saskaņošanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-9/202".
- ¹¹⁴Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 23.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegts projekta ekspertīzes laikā no projektētājiem saņemto tāmju 15.korpusa jumta nomainīšanai un balkonu atjaunošanai uzskaitījums. Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstule. Ar Veselības ministrijas 02.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegts Ministru kabineta 05.05.2020. rīkojuma Nr.237 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācija) norādītā finansējuma detalizēts aprēķins. Iepirkuma identifikācijas Nr.PSKUS 2020/56. Pieejams: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38852>, skatīts 12.06.2020. Iepirkuma identifikācijas Nr.PSKUS 2020/56. Pieejams: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38852>, dokuments "Tāme (TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA_1_TĀME_PSKUS_jumts_19.05.2020.xlsx)", skatīts 07.09.2020.
- ¹¹⁵Iepirkuma identifikācijas Nr.PSKUS 2020/85. Pieejams: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40701>, skatīts 10.08.2020.
- ¹¹⁶Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARGUS", vienotais reģistrācijas numurs 40103780602.
- ¹¹⁷Iepirkuma identifikācijas Nr.PSKUS 2020/85. Pieejams: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40701>, skatīts 29.09.2020. Aktuāls dokuments (pievienots 23.09.2020.): "Līgums".
- ¹¹⁸VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 29.09.2020. e-pasta vēstule.
- ¹¹⁹Līgumcenas 974 372,07 *euro* (bez pievienotās vērtības nodokļa) jeb 1 178 990,21 *euro* (ar pievienotās vērtības nodokli) un Ministru kabineta atbalstītā finansējuma 661 221 *euro* starpība ir 514 769,21 *euro*.
- ¹²⁰VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 23.09.2020. e-pasta vēstule.
- ¹²¹Ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 25.09.2020. e-pasta vēstuli Valsts kontrolei iesniegts dokuments "Kalendārais plāns. 15.korpusa ēkas jumta seguma nomainīšana, jumta dzegas atjaunošana, balkonu atjaunošana Pilsoņu ielā 13, Rīgā".
- ¹²²Veselības ministrijas 31.08.2020. e-pasta vēstule; Veselības ministrijas 22.09.2020. e-pasta vēstule.
